

Etapa 3 + 4, provoz bude řízen kyvadlově – 2 semaforey, v pracovní době regulovčíky
21.-27.9.2026


Pozice opravovaného úseku:

<https://mapy.com/s/merezagehu>

BUS zastávky – Lidečko, Čertovy skály nebudou obsluhovány a budou dočasně přesunuty.

BUS zastávka ve směru na Horní Lideč bude přesunuta před pracovní místo na provizorní zastávku u čistírny odpadních vod nebo lze taky využít další zastávku – Lidečko, zastávka.

BUS zastávka ve směru na Vsetín bude přesunuta před pracovní místo do BUS stávající zastávky - Lidečko, zastávka.

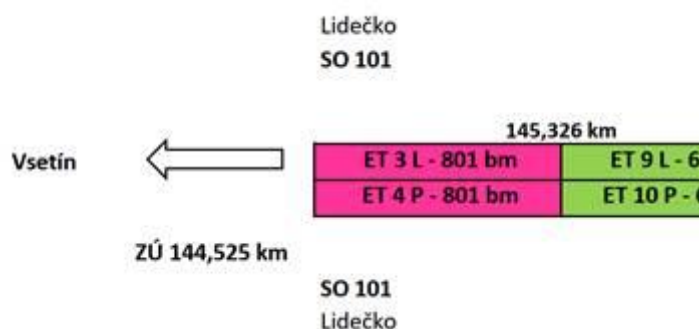

HMG prací Etapa 3 Levá + 4 Pravá (SO 101 – Lidečko – kolem Čertových skal):

- **Pondělí 21.9.** – plošné frézování vozovky po polovinách šířky
Zahájení bude na etapě 3 – levá strana a přes den cca v poledne bude přesun na etapu 4 – pravá strana
- **Úterý 22.9.** – rezerva na dofrézování vozovky v etapě 4
Etapa 4 - pokládka ACL na pravé polovině vozovky + montáž geomříže
(uzavřen vjezd/výjezd k Čertovým skalám + přilehlé MK)
- **Středa 23.9.** – Etapa 4 – pokládka finální asf.vrstvy SMA na pravé polovině vozovky v celé délce
(uzavřen vjezd/výjezd k Čertovým skalám + přilehlé MK)
- **Čtvrtek 24.9.** – Etapa 3 – pokládka lokálních sanací ACL na levé polovině vozovky
,případná rezerva na pokládku SMA u etapy 4
(uzavřen vjezd/výjezd do ČS Avia a k motorestu + přilehlé MK)
- **Pátek 25.9.** – Etapa 3 - pokládka finální vrstvy SMA na levé polovině vozovky
(uzavřen vjezd/výjezd do ČS Avia a k motorestu + přilehlé MK)
- **Sobota 26.9.** – Etapa 3 - rezerva na pokládku SMA
Ošetření prac. spár asf. zálivkou, popřípadě předznačení VDZ v barvě – v celé délce pracovního místa.
(uzavřen vjezd/výjezd do ČS Avia a k motorestu + přilehlé MK)
- **Neděle 27.9.** – rezerva na počasí, případně sklizení DIO - PDZ
