


Etapa 5 + 6, provoz bude řízen kyvadlově – 2 semaforey, v pracovní době regulovčíky 28.9.-4.10.2026

Pozice opravovaného úseku:

<https://mapy.com/s/gulatuzeve>

BUS zastávky – Horní Lideč, u žel. stanice, nebudou obsluhovány
a budou dočasně přesunuty na točnu – BUS zastávky Horní Lideč, škola.

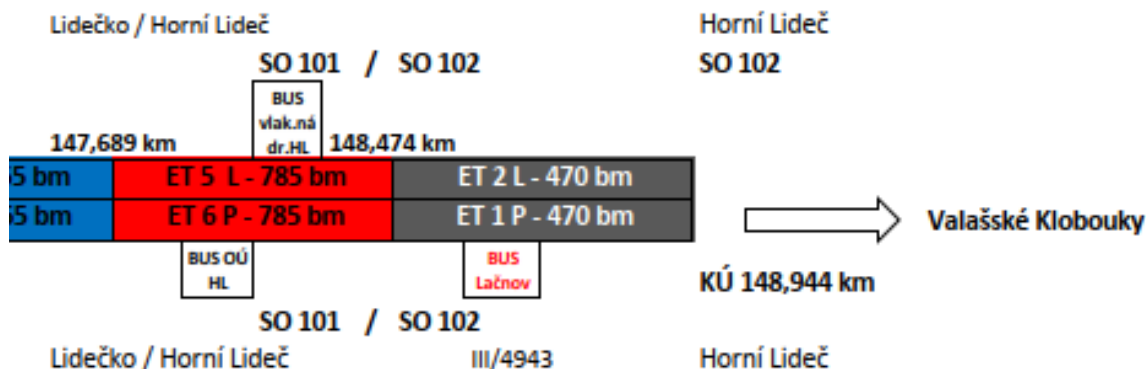

HMG prací Etapa 5 Levá + 6 Pravá (SO 101 – Horní Lideč):

- **Pondělí 28.9.** – plošné frézování vozovky po polovinách šířky
Zahájení bude na etapě 6 – pravá strana (u OÚ) a přes den cca v poledne bude přesun na etapu 5 – levá strana (u vlak. nádr.)
- **Úterý 29.9.** – rezerva na dofrézování vozovky v etapě 5
Etapa 5 – sanace – pokládka ACL na levé polovině vozovky
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD a k vlakovému nádraží + přilehlé MK)
- **Středa 30.9.** – Etapa 5 – pokládka finální asf. vrstvy SMA na levé polovině vozovky v celé délce
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD a k vlakovému nádraží + přilehlé MK)
- **Čtvrtek 1.10.** – Etapa 6 – frézování a pokládka lokálních sanací ACL na pravé polovině vozovky, (případná rezerva na pokládku SMA u etapy 5)
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD a k OÚ + přilehlé MK)
- **Pátek 2.10.** – Etapa 6 - pokládka finální vrstvy SMA na pravé polovině vozovky
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD a k OÚ + přilehlé MK)
- **Sobota 3.10.** – Etapa 6 - rezerva na pokládku SMA
Ošetření prac. spár asf. zálivkou, popřípadě předznačení VDZ v barvě – v celé délce pracovního místa.
(uzavřeny vjezdy/výjezdy k RD a k OÚ + přilehlé MK)
- **Neděle 4.10.** – rezerva na počasí, případně sklizení DIO – PDZ
